



PROJE YOL HARİTASI

ve Görev Dağılımı Raporu

Web Tabanlı Proje Yönetim Platformu Geliştirme Projesi

DERS

Yazılım Proje Yönetimi

DÖNEM

5 Ekim - 7 Aralık 2026

KAPSAM

9 sprint • 7 kişi • 5 modül

SÜRÜM

1.0 • 4 Ekim 2026

SEK TECH

Proje Ekibi • Yazılım Şirketi Simülasyonu

İçindekiler

01 Yönetici Özeti	3
02 Proje Kapsamı ve Hedefler	4
03 Ekip Yapısı ve Roller	5
04 Çalışma Modeli	7
05 Zaman Çizelgesi ve Kilometre Taşları	9
06 Haftalık Detaylı Plan	10
07 İş Yüğü Dağılımı	20
08 Sorumluluk Matrisi (RACI)	21
09 Teknik Mimari (Taslak)	22
10 Risk Yönetimi	23
11 Sprint 0'da Verilecek Kararlar	24
12 Teslim Kontrol Listesi	26

Bu rapor nasıl okunmalı?


Bölüm 1–5 projenin çerçevesini (kapsam, ekip, çalışma modeli, takvim) çizer. Bölüm 6 her ekip üyesinin hafta hafta yapacağı işleri listeler; her hafta tek sayfadır ve o haftanın teslimatıyla biter. Bölüm 7–12 iş yüğü, sorumluluk matrisi, mimari, riskler, Sprint 0'da verilecek kararlar ve teslim kontrol listesini içerir. Herkesin her hafta yalnızca kendi satırını okuması yeterlidir.

01 Yönetici Özeti

Bu rapor, SEK TECH ekibinin Yazılım Proje Yönetimi dersi kapsamında geliştireceği web tabanlı proje yönetim platformunun 5 Ekim – 7 Aralık 2026 dönemini kapsayan yol haritasını ve ekip üyeleri arasındaki haftalık görev dağılımını tanımlar. Proje, ders yönergesindeki beş fonksiyonel modülü (proje ve görev yönetimi; kullanıcı ve rol yönetimi; takvim ve zaman yönetimi; dokümantasyon ve dosya paylaşımı; raporlama ve analiz) haftalık sprintlerle ve ölçülebilir kilometre taşları üzerinden teslim etmeyi hedefler.



Kilometre taşları

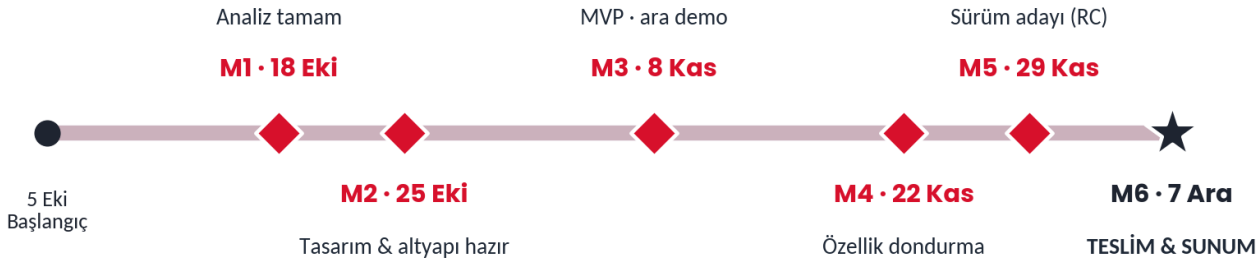

Şekil 1 · Proje boyunca altı kontrol noktası

Temel yaklaşım

Ders yönergesine göre değerlendirme yalnızca çalışan yazılıma değil; dokümantasyona, test raporlarına ve ekip içi iş bölümüne de dayanmaktadır. Bu nedenle plan iki paralel hat üzerine kurulmuştur: ürün hattı (tasarım → geliştirme → test) ve süreç hattı (sprint törenleri, haftalık raporlar, kod inceleme kayıtları). Her hafta sonunda hem çalışan bir ürün artışı hem de o haftanın süreç kanıtı üretilir.

#	Kritik başarı faktörü	Ne anlama geliyor
1	Kapsam disiplini	Azure DevOps ilhamı Azure Boards ölçeğinde tutulur; yeni fikirler sprint içine değil backlog'a girer.
2	Erken entegrasyon	API sözleşmesi 3. haftada dondurulur; frontend ve backend her hafta birlikte çalışan bir artış çıkarır.
3	Sürekli test	Test son haftaya bırakılmaz; 3. haftadan itibaren her Pull Request otomatik testten geçer.
4	Kanıt üretimi	Pano, PR geçmişi, toplantı notu ve haftalık rapor her hafta düzenli olarak arşivlenir.

Takvim notu

5 Ekim Pazartesi ile 6 Aralık Pazar arası tam 9 haftadır. 7 Aralık Pazartesi teslim ve müşteri sunumu günü olarak planlanmıştır. Plan bu nedenle 9 haftalık sprint (Sprint 0–8) + teslim günü olarak kurgulanmıştır.

02 Proje Kapsamı ve Hedefler

2.1 Ürün vizyonu

Azure DevOps'un iş takibi bileşeni olan Azure Boards'tan ilham alan; küçük ve orta ölçekli yazılım ekiplerinin projelerini, görevlerini ve ilerlemesini tek bir web arayüzünden yönetebildiği bir proje yönetim platformu. Azure DevOps'un Repos, Pipelines ve Test Plans gibi bileşenleri bu dönemin kapsamı dışındadır; ders yönergesindeki beş modül, Azure Boards ölçeğine karşılık gelir.

2.2 Fonksiyonel modüller

Kod	Modül	Kapsam (ders yönergesinden)	Hafta
M1	Proje & Görev Yönetimi	Proje oluşturma (ad, açıklama, başlangıç-bitiş); görev tanımlama, kişiye atama; To Do / In Progress / Done durumları	H4-H5
M2	Kullanıcı & Rol Yönetimi	Yönetici ve Ekip Üyesi rolleri; role göre yetkiler (görev atama, düzenleme vb.)	H3-H4
M3	Takvim & Zaman Yönetimi	Görev tarihlerinin takvim üzerinden izlenmesi; Kanban panosu ve Gantt şeması	H5-H6
M4	Dokümantasyon & Dosya Paylaşımı	Projeye doküman yükleme ve ekip erişimi; yorumlarla ekip içi iletişim	H5-H6
M5	Raporlama & Analiz	Yüzdelik ilerleme; kişi bazlı tamamlama raporu; günlük/haftalık/aylık ilerleme raporları	H6-H7

2.3 Önceliklendirme (MoSCoW) – öneri

Aşağıdaki önceliklendirme bir başlangıç önerisidir; Sprint 0'da Abdulkahhar (Müşteri Temsilcisi) ve Hakan (Proje Yöneticisi) tarafından ekiple birlikte kesinleştirilir. Must maddeleri ders yönergesinin doğrudan karşılığıdır; zaman daralırsa ilk kesilecek olanlar Could maddeleridir.

MUST Olmazsa olmaz	Giriş/kayıt ve rol bazlı yetki · Proje CRUD ve üyelik · Görev CRUD, atama, durum · Kanban panosu · Takvim görünümü · Dosya yükleme/indirme · Görev yorumları · İlerleme yüzdesi · Kişi bazlı rapor · Günlük/haftalık/aylık rapor
SHOULD Olmalı	Gantt şeması · Dashboard grafikleri · Görev önceliği ve etiketler · Arama ve filtreleme · Uygulama içi bildirimler
COULD Olabilir	Sprint/iterasyon yönetimi (Azure Boards benzeri) · E-posta bildirimleri · Aktivite geçmişi · Rapor dışı aktarma (CSV/PDF) · Karanlık tema
WON'T Bu dönem yok	Kod deposu (Repos) · CI/CD pipeline modülü (Pipelines) · Test Plans modülü · Mobil uygulama · Gerçek zamanlı ortak düzenleme

Neden Gantt “Should”?


Yönerge “Gantt şeması veya Kanban panosu” ifadesini kullanır; ikisinden biri zorunlu görünmektedir. Kanban, Scrum/Kanban süreciyle doğrudan bağlantılı olduğu için Must, Gantt ise Should olarak önerilmiştir. Bu yorumun Sprint 0'da öğretim üyesine teyit ettirilmesi önerilir.

03 Ekip Yapısı ve Roller



Şekil 2 - SEK TECH proje ekibi ve birincil roller

Ders yönergesinde 11 rol tanımlanmıştır; ekip 7 kişi olduğundan Scrum Master, UI/UX Tasarımcısı, Dokümantasyon Sorumlusu ve DevOps Uzmanı rolleri mevcut üyelere ikincil rol olarak önerilmiştir. Öneriler, her kişinin birincil rolüne en yakın iş akışına göre yapılmıştır ve Sprint 0'da ekipçe onaylanmalıdır.

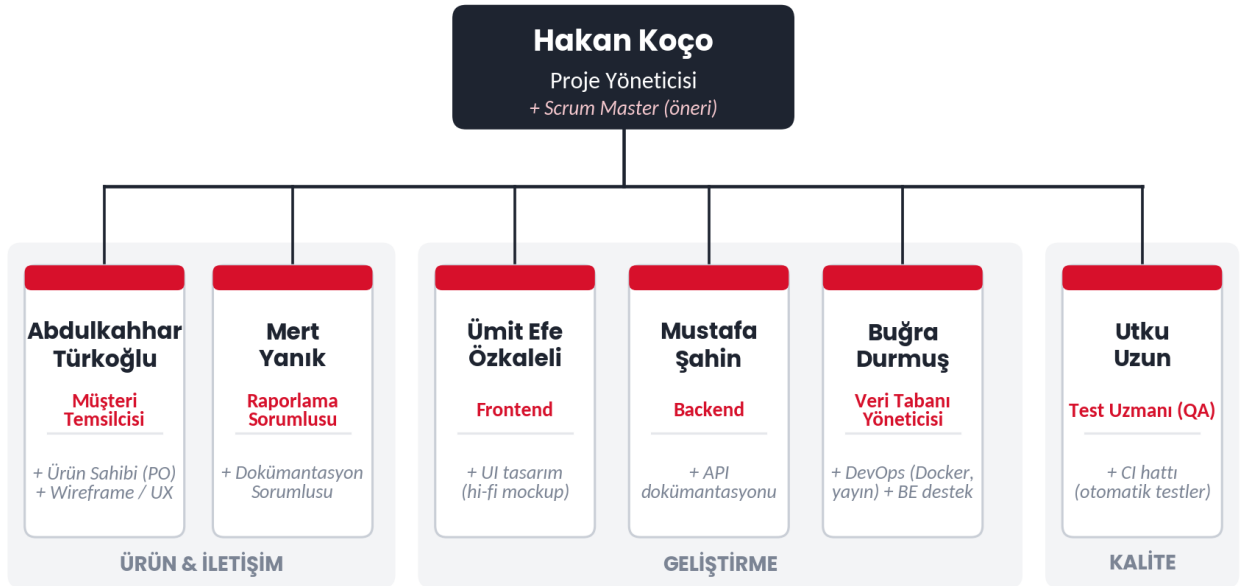

Şekil 3 - Organizasyon şeması: birincil ve önerilen ikincil roller

3.1 Rol ve sorumluluk tablosu

Ekip üyesi	Birincil rol	İkincil rol (öneri)	Temel sorumluluklar	Ana çıktılar
Hakan Koço	Proje Yöneticisi	Scrum Master	Planlama, sprint törenleri, kapasite ve risk yönetimi, FE-BE entegrasyon koordinasyonu, PR kurallarının işletilmesi	Proje tüzüğü, sürüm planı, risk kaydı, kapanış raporu
Abdulkahhar Türkoğlu	Müşteri Temsilcisi	Ürün Sahibi (PO), Wireframe/UX	Gereksinimlerin toplanması, kullanıcı hikâyeleri ve kabul kriterleri, önceliklendirme, kabul testleri, müşteri sunumu	SRS, backlog, wireframe'ler, UAT raporu, demo senaryosu
Mert Yanık	Raporlama Sorumlusu	Dokümantasyon Sorumlusu	Haftalık ilerleme raporları, toplantı notları, burndown, proje dokümantasyonu; raporlama modülünün metrik tanımları	9 haftalık rapor, final doküman, kullanım kılavuzu, slaytlar
Ümit Efe Özkaleli	Frontend Geliştirici	UI Tasarım (hi-fi)	Hi-fi mockup ve tasarım sistemi, tüm ekranların geliştirilmesi, API entegrasyonu	Mockup'lar, frontend uygulaması
Mustafa Şahin	Backend Geliştirici	API Dokümantasyonu	Mimari, kimlik doğrulama ve RBAC, iş kuralları, REST API, dosya ve rapor servisleri	Backend uygulaması, OpenAPI dokümanı
Buğra Durmuş	Veri Tabanı Yöneticisi	DevOps, Backend destek	ER diyagramı, şema ve migration'lar, rapor sorguları, Docker ortamı, yayın ve yedekleme	ER diyagramı, şema, compose dosyası, canlı ortam
Utku Uzun	Test Uzmanı (QA)	CI Sorumlusu	Test stratejisi ve planı, otomatik ve manuel testler, CI hattı, hata yönetimi	Test planı, test setleri, Test Raporu


Darboğaz uyarısı

Frontend ve backend birer kişiye bağlıdır; beş modülün tüm ekranları Ümit'te, tüm servisleri Mustafa'dadır. Bu yükü dengelemek için plan boyunca Abdulkahhar frontend tarafında (statik bileşenler, basit ekranlar), Buğra ise backend tarafında (sorgular, dosya servisi, rapor sorguları) destek görevleri üstlenir. Bu, iş bölümünün koda yansımaları açısından da değerlendirmeye olumlu katkı sağlar.

04 Çalışma Modeli

Ders yönergesi her hafta sprint toplantısı yapılmasını şart koştuğu için çalışma ritmi bir haftalık sprintler üzerine kurulmuştur. Bu ritim Scrum, Kanban veya hibrit (Scrumban) yaklaşımlarının üçüyle de uyumludur; nihai metodoloji seçimi Bölüm 11'deki karar toplantısında yapılır.

4.1 Haftalık sprint döngüsü

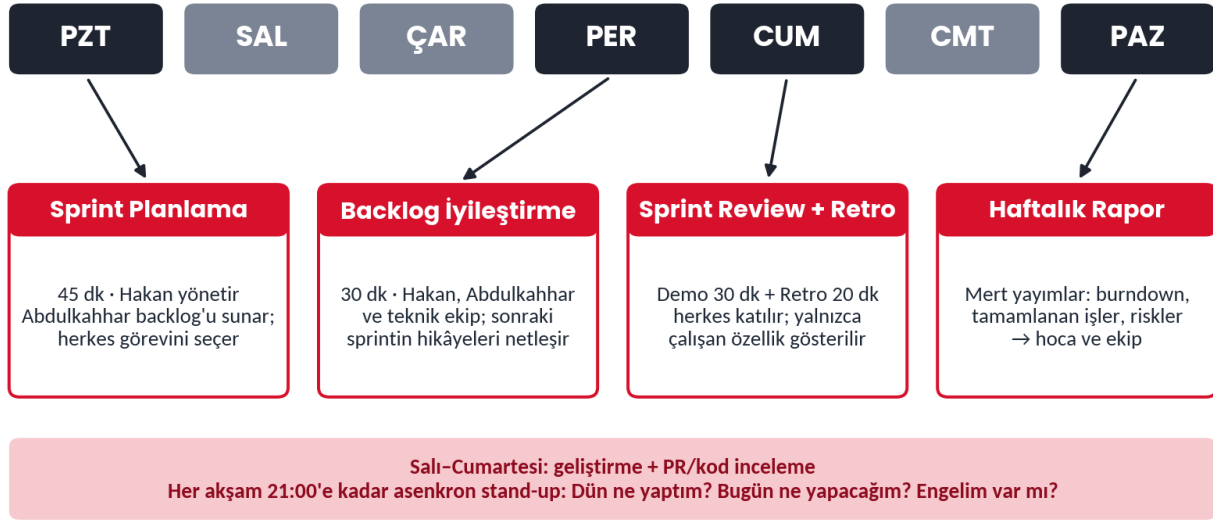

Şekil 4 · Her hafta tekrarlanan sprint döngüsü


Tören	Gün	Süre	Yöneten	Katılımcılar	Çıktı
Sprint Planlama	Pazartesi	45 dk	Hakan	Tüm ekip	Sprint hedefi ve sprint backlog'u
Asenkron stand-up	Sal-Cmt, 21:00	—	Hakan takip eder	Tüm ekip	Güncel pano, görünür engeller
Backlog İyileştirme	Perşembe	30 dk	Abdulkahhar	Hakan + teknik ekip	Netleşmiş, tahminlenmiş hikâyeler
Sprint Review (demo)	Cuma	30 dk	Hakan	Tüm ekip	Çalışan artış, geri bildirim
Retrospektif	Cuma	20 dk	Hakan	Tüm ekip	1-2 somut iyileştirme aksiyonu
Haftalık Rapor	Pazar	—	Mert	Hoca + ekip	Haftalık İlerleme Raporu

Ders saatinde öğretim üyesine yapılan haftalık sprint değerlendirmesinde Mert'in son haftalık raporu ve Cuma günü demo kullanılır; böylece ekip her hafta aynı kanıt setiyle derse gelir.

4.2 İletişim kanalları ve kurallar

Kanal	Amaç	Kural
WhatsApp grubu	Hızlı iletişim, duyurular	Grupta alınan kararlar aynı gün panoya veya toplantı notuna işlenir.
Takip panosu	Tüm işlerin tek doğruluk kaynağı	Panoda kartı olmayan iş yapılmamış sayılır; her kartın tek sahibi olur.
GitHub deposu	Kod, Pull Request, kod inceleme	main ve develop korumalı; doğrudan push yapılmaz.
Ortak doküman alanı	SRS, tasarım, raporlar, notlar	Mert'in kurduğu klasör yapısına ve şablonlara uyulur.
Figma	Wireframe ve mockup	Abdulkahhar wireframe, Ümit hi-fi mockup sahibidir.

4.3 Git dallanma stratejisi

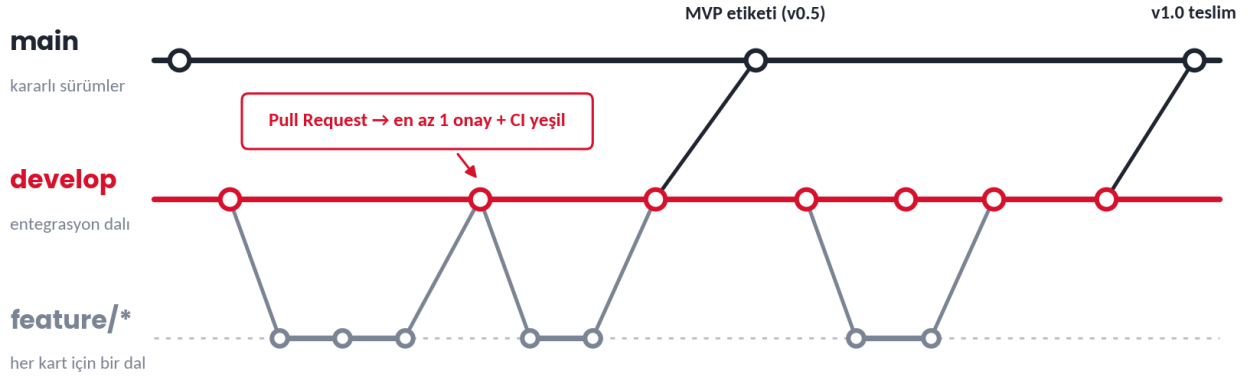

Şekil 5 - main / develop / feature dal modeli


Dal adları **feature/<kart-no>-kisa-aciklama** biçimindedir. Commit mesajları **feat:**, **fix:**, **docs:**, **test:**, **refactor:** örnekleriyle yazılır. Pull Request'ler küçük tutulur (ideal olarak tek kart), en az bir onay almadan ve CI yeşil olmadan birleştirilmez. Bu düzen, değerlendirmede aranan kod inceleme sürecinin doğal kanıtını oluşturur.

4.4 Tamamlandı Tanımı (Definition of Done)

- ☐ Kod bir feature dalında geliştirildi ve Pull Request ile develop dalına birleştirildi.
- ☐ En az bir ekip üyesi kodu inceledi ve onayladı.
- ☐ CI hattı yeşil: build ve otomatik testler geçiyor.
- ☐ Yeni işlev için en az bir otomatik test (birim veya API) yazıldı.
- ☐ Kabul kriterleri Abdulkahhar tarafından kontrol edildi.
- ☐ API değiştiyse OpenAPI/Swagger dokümanı güncellendi.
- ☐ Panodaki kart "Done" sütununda ve ilgili PR'a bağlantılı.

Bir kart ancak yukarıdaki maddelerin tamamı sağlandığında "Done" sütununa taşınabilir.

05 Zaman Çizelgesi ve Kilometre Taşları

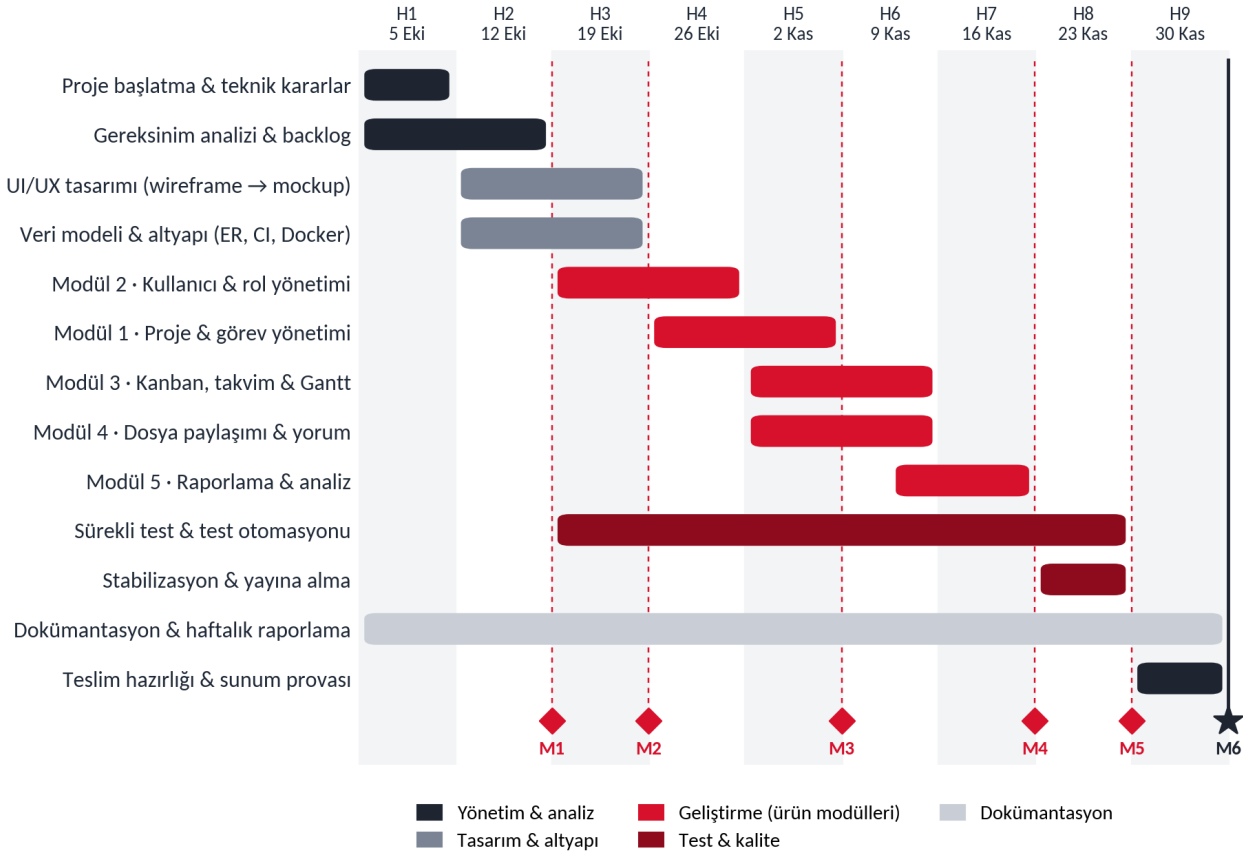

Şekil 6 · Faz ve modül bazında Gantt şeması (H = hafta, altında haftanın başlangıç tarihi)

Kod	Tarih	Kilometre taşı	Başarı kriteri	Sorumlu
M1	18 Ekim	Analiz tamamlandı	SRS v1.0 onaylı; backlog tahminlenmiş; ER diyagramı ve API sözleşmesi taslağı hazır	Hakan, Abdulkahhar
M2	25 Ekim	Tasarım & altyapı hazır	Hi-fi mockup onaylı; CI her PR'da çalışıyor; giriş/kayıt uçtan uca çalışıyor; tek komutla kurulum	Ümit, Utku, Buğra
M3	8 Kasım	MVP · ara demo	Rol bazlı giriş, proje ve görev yönetimi, atama ve Kanban uçtan uca; v0.5 etiketi	Hakan
M4	22 Kasım	Özellik dondurma	Beş modülün Must özellikleri tamam; yeni özellik eklenmez	Hakan, Abdulkahhar
M5	29 Kasım	Sürüm adayı (RC)	Kritik/yüksek önemde açık hata yok; yayın ortamında çalışıyor; Test Raporu v1	Utku, Buğra
M6	7 Aralık	Teslim & müşteri sunumu	Demo, dokümantasyon, test raporu ve süreç kanıtları teslim edildi	Tüm ekip

06 Haftalık Detaylı Plan

Bu bölümde her hafta ayrı bir sayfada ele alınmıştır. Her sayfa; haftanın sprint hedefini, yedi ekip üyesinin o haftaki görevlerini, beklenen çıktıları ve haftanın sonunda doğrulanacak teslimatı içerir. Görevler, Sprint Planlama toplantısında takip panosuna kart olarak aktarılmalı ve her kartın tek bir sahibi olmalıdır.

Kısaltma	Anlamı
H1 ... H9	Proje haftaları (H1 = 5-11 Ekim, H9 = 30 Kasım-6 Aralık)
M1 ... M6	Kilometre taşları (Bölüm 5)
FE / BE / VT	Frontend / Backend / Veri Tabanı
SRS	Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu (gereksinim dokümanı)
MVP	Minimum uygulanabilir ürün: uçtan uca çalışan ilk sürüm
UAT	Kullanıcı kabul testi (müşteri gözüyle doğrulama)
RC	Sürüm adayı (Release Candidate)
CI	Sürekli entegrasyon: her PR'da otomatik build ve test

Haftalara genel bakış

Hafta	Tarih	Sprint	Odak
H1	5 - 11 Ekim	Sprint 0	Proje Başlatma & Gereksinim Analizi
H2	12 - 18 Ekim	Sprint 1	Analiz & Sistem Tasarımı
H3	19 - 25 Ekim	Sprint 2	UI Tasarımı & Altyapı Kurulumu
H4	26 Ekim - 1 Kasım	Sprint 3	Kullanıcı/Rol & Proje Yönetimi
H5	2 - 8 Kasım	Sprint 4	Görev Yönetimi & Kanban Panosu
H6	9 - 15 Kasım	Sprint 5	Takvim, Gantt & Dosya Paylaşımı
H7	16 - 22 Kasım	Sprint 6	Raporlama & Analiz
H8	23 - 29 Kasım	Sprint 7	Test, Stabilizasyon & Yayına Alma
H9	30 Kasım - 6 Aralık	Sprint 8	Teslim Hazırlığı & Sunum Provası

HAFTA

1

SPRINT 0 · BAŞLATMA

5 – 11 Ekim 2026

Proje Başlatma & Gereksinim Analizi



Sprint hedefi

Ekibin çalışma altyapısını kurmak, teknik kararları vermek ve ürün gereksinimlerini yazılı hale getirmek.

Ekip üyesi	Bu haftanın görevleri	Çıktı
Hakan Koço Proje Yöneticisi	- Açılış (kickoff) toplantısını yönetmek; rol ve ikincil rol önerilerini ekibe onaylatmak - Karar toplantısını yönetmek (en geç 8 Ekim Perşembe): metodoloji, stack, veri tabanı, takip aracı - Git deposunu ve takip panosunu kurmak; dal koruma kurallarını tanımlamak - Proje tüzüğünü yazmak: amaç, kapsam, roller, iletişim kuralları	Proje tüzüğü · kurulu repo ve pano · karar tutanağı
Abdulkahhar Türkoğlu Müşteri Temsilcisi	- Rakip analizi: Jira, Trello, Azure Boards ve OpenProject özellik karşılaştırması - Kullanıcı personaları (Yönetici, Ekip Üyesi) ve temel kullanım senaryoları - Gereksinim dokümanı (SRS) v0.5: beş modülün fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri - MoSCoW önceliklendirme taslağı ve ürün adı önerileri	Rakip analizi · SRS v0.5 · MoSCoW taslağı
Mert Yanık Raporlama Sorumlusu	- Doküman şablonlarını hazırlamak: haftalık rapor, toplantı notu, sprint review notu - Ortak doküman alanında klasör yapısını kurmak - Tüm toplantı notlarını tutmak ve yayımlamak 1. Haftalık İlerleme Raporu (Pazar)	Şablon seti · Rapor #1
Ümit Efe Özkaleli Frontend	- Frontend seçenekleri (React / Angular) için kısa karşılaştırma ve ekibe 10 dk sunum - UI bileşen kütüphanesi seçeneklerini araştırmak - Rakip arayüzlerin UX incelemesi (Abdulkahhar ile)	Frontend teknoloji notu
Mustafa Şahin Backend	- Backend seçenekleri (Node.js / Django / Spring Boot) için kısa karşılaştırma ve ekibe sunum - Yüksek seviye mimari taslağı (katmanlar, modüller) - Kimlik doğrulama yaklaşımlarını araştırmak (token / oturum)	Backend teknoloji notu · mimari taslak
Buğra Durmuş Veri Tabanı Yöneticisi	- Veri tabanı seçenekleri karşılaştırması (PostgreSQL / MySQL / MongoDB) - İlk varlık listesi: Kullanıcı, Rol, Proje, Görev, Yorum, Dosya - Yerel geliştirme ortamı planı (Docker ile kurulum)	VT karşılaştırma notu · varlık listesi
Utku Uzun Test Uzmanı	- Test stratejisi taslağı: birim, API, uçtan uca ve manuel test seviyeleri - Test araçlarını aday stack'lere göre araştırmak - Tamamlandı Tanımı (Definition of Done) önerisi hazırlamak	Test stratejisi v0.5 · DoD önerisi

Haftanın teslimatı

Tüm teknik kararlar verilmiş ve tutanağa geçmiş; SRS taslağı ekipçe gözden geçirilmiş; repo ve pano kullanıma açık; herkes kendi rolündeki ilk dokümanı teslim etmiş.


HAFTA

2

SPRINT 1 · ANALİZ

12 – 18 Ekim 2026

Analiz & Sistem Tasarımı



Sprint hedefi

Gereksinimleri kullanıcı hikâyelerine dönüştürmek; veri modelini, API sözleşmesini ve ekran taslaklarını çıkarmak.

Ekip üyesi	Bu haftanın görevleri	Çıktı
Hakan Koço Proje Yöneticisi	- SRS v1.0'ı onaylatmak; ürün backlog'unu Abdulkahhar ile oluşturmak - Planning poker ile hikâyeleri tahminlemek (story point) - Sürüm planı: hangi modül hangi haftada (bu raporla uyumlu) - Risk kaydını açmak ve risk sahiplerini atamak	Tahminlenmiş backlog · sürüm planı · risk kaydı
Abdulkahhar Türkoğlu Müşteri Temsilcisi	- Kullanıcı hikâyeleri ve kabul kriterleri ("... olarak ... istiyorum, böylece ...") - Düşük çözünürlüklü wireframe'ler: giriş, dashboard, proje listesi, Kanban, görev detayı, takvim, raporlar - Kullanıcı akış diyagramı	User story seti · wireframe'ler
Mert Yanık Raporlama Sorumlusu	- Sprint 0 raporu ve karar tutanağını yayımlamak - Proje dokümanı iskeletini oluşturmak (tüm bölümler başlık düzeyinde) - Raporlama modülü için metrik/KPI gereksinimlerini yazmak: hangi rapor, hangi veri	Rapor #2 · doküman iskeleti · rapor gereksinimleri
Ümit Efe Özkaleli Frontend	- Frontend proje iskeleti: klasör yapısı, yönlendirme (routing), UI kütüphanesi kurulumu - Wireframe'lere teknik fizibilite geri bildirimi - Ortak bileşen listesi: buton, form, kart, tablo, modal	Çalışan boş FE iskeleti
Mustafa Şahin Backend	- Backend proje iskeleti: katmanlı yapı (controller / service / repository) - API sözleşmesi taslağı: endpoint listesi, istek/yanıt örnekleri (OpenAPI) - Ortak hata yönetimi ve yanıt formatı standardı	BE iskeleti · API sözleşmesi v0.5
Buğra Durmuş Veri Tabanı Yöneticisi	- ER diyagramı: tablolar, ilişkiler, anahtarlar, normalizasyon - Görev durum geçmişi tablosunu modele eklemek (raporlama için şart) - Docker Compose ile yerel veri tabanı ortamı	ER diyagramı v1 · yerel VT ortamı
Utku Uzun Test Uzmanı	- Test planı: kapsam, ortamlar, giriş/çıkış kriterleri - Kullanıcı hikâyelerinden ilk test senaryolarını türetmek - Hata raporu şablonu ve önem seviyeleri (Kritik / Yüksek / Orta / Düşük)	Test planı v1 · hata şablonu

M1 · Analiz tamamlandı (18 Ekim)

SRS v1.0 onaylı, backlog tahminlenmiş, ER diyagramı ve API sözleşmesi taslağı hazır.

HAFTA

3

SPRINT 2 · TASARIM

19 – 25 Ekim 2026

UI Tasarımı & Altyapı Kurulumu



Sprint hedefi

Yüksek çözünürlüklü tasarımı tamamlamak; veri tabanı şemasını, CI hattını ve kimlik doğrulamayı çalışır hale getirmek.

Ekip üyesi	Bu haftanın görevleri	Çıktı
Hakan Koço Proje Yöneticisi	- Sprint törenlerini yönetmek; PR inceleme kuralının işletilmesini sağlamak - Ekibin vize takvimini toplayıp kapasite planına işlemek - FE-BE entegrasyon toplantısı: API sözleşmesinin dondurulması	Kapasite planı · dondurulmuş API v1
Abdulkahhar Türkoğlu Müşteri Temsilcisi	- Mockup'lara müşteri gözüyle geri bildirim vermek ve tasarımı onaylamak - H4-H5 hikâyelerinin kabul kriterlerini netleştirmek - Ürün adını ve kimliğini ekipçe kesinleştirmek	Onaylı mockup'lar · hazır backlog
Mert Yanık Raporlama Sorumlusu	- Sprint 1 raporu - Tasarım kararları dokümanı: neden bu stack, neden bu mimari - Teknoloji ve araç envanteri dokümanı	Rapor #3 · tasarım kararları dokümanı
Ümit Efe Özkaleli Frontend	- Figma'da yüksek çözünürlüklü mockup ve tasarım sistemi (renk, tipografi, bileşenler) - Ana yerleşim (layout): kenar menü, üst çubuk - Giriş / kayıt ekranlarının kodlanması	Hi-fi mockup · giriş ekranı
Mustafa Şahin Backend	- Kimlik doğrulama: kayıt, giriş, şifre özetleme (hash), token üretimi - Kullanıcı modeli ve temel endpoint'ler - Swagger/OpenAPI dokümantasyonunu yayına almak	Çalışan auth API'si
Buğra Durmuş Veri Tabanı Yöneticisi	- Şemanın migration'larla kodlanması - Örnek (seed) veri betiği - Docker Compose ile tüm sistemi tek komutla ayağa kaldırma	Migration'lar · seed · compose dosyası
Utku Uzun Test Uzmanı	- CI hattı (ör. GitHub Actions): her PR'da build + test - FE ve BE için birim test altyapısı - Kimlik doğrulama için ilk otomatik API testleri	Çalışan CI · ilk testler

M2 · Tasarım & altyapı hazır (25 Ekim)

Mockup'lar onaylı; CI her PR'da çalışıyor; kullanıcı kayıt olup giriş yapabiliyor; sistem tek komutla kuruluyor.


HAFTA

4

SPRINT 3 · GELİŞTİRME

26 Ekim – 1 Kasım 2026

Kullanıcı/Rol & Proje Yönetimi



Sprint hedefi

Rol tabanlı yetkilendirmeyi ve proje oluşturma-düzenleme akışını uçtan uca çalıştırmak (Modül 2 + Modül 1'in proje kısmı).

Not

29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim öğleden sonra yarım gün). Kapasite yaklaşık %80 alınmış, sprint hedefi buna göre dar tutulmuştur.

Ekip üyesi	Bu haftanın görevleri	Çıktı
Hakan Koço Proje Yöneticisi	- Kısa haftaya göre sprint kapsamını daraltmak - İlk burndown takibini başlatmak (Mert ile) - PR'ların en geç 24 saat içinde incelenmesini takip etmek	Sprint 3 planı · burndown
Abdulkahhar Türkoğlu Müşteri Temsilcisi	- Rol ve proje hikâyeleri için manuel kabul testi - H5 (görev & Kanban) hikâyelerini hazır hale getirmek - MVP demo senaryosunun ilk taslağı	Kabul testi notları · demo taslağı
Mert Yanık Raporlama Sorumlusu	- Sprint 2 raporu - API dokümanını proje dokümanına bağlamak - Hocaya sunulacak ara ilerleme raporunun taslağı	Rapor #4
Ümit Efe Özkaleli Frontend	- Proje listesi, proje oluşturma/düzenleme formu, proje detay sayfası - Role göre arayüz: yöneticiye özel butonlar ve menüler - API entegrasyonu: token saklama, yetkisiz erişimde yönlendirme	Proje ekranları
Mustafa Şahin Backend	- Rol/yetki (RBAC) ara katmanı (middleware) - Kullanıcı yönetimi: yöneticinin kullanıcı ekleme ve rol atama endpoint'leri - Proje CRUD ve proje üyeliği endpoint'leri	RBAC + proje API'si
Buğra Durmuş Veri Tabanı Yöneticisi	- Rol, yetki ve proje üyeliği tabloları - Sık kullanılan sorgular için indeksler - Mustafa'ya sorgu/repository katmanında destek	Güncel şema
Utku Uzun Test Uzmanı	- Rol, yetki ve proje API'leri için otomatik testler - Yetki testleri (ör. Ekip Üyesi proje silememeli) - İlk manuel test turu ve hata kayıtları	Test seti · hata kayıtları

Haftanın teslimatı

Yönetici kullanıcı ekleyip rol atayabiliyor; proje oluşturulup üyeler eklenebiliyor; Ekip Üyesi yetkisi olmayan işlemleri yapamıyor ve bu durum testlerle doğrulanmış.

HAFTA

5

SPRINT 4 · GELİŞTİRME

2 – 8 Kasım 2026

Görev Yönetimi & Kanban Panosu



Sprint hedefi

Görev oluşturma, atama, durum değiştirme ve Kanban panosunu uçtan uca çalıştırarak MVP'yi tamamlamak.

Ekip üyesi	Bu haftanın görevleri	Çıktı
Hakan Koço Proje Yöneticisi	- Ara demo (MVP) organizasyonu ve sprint review'un yönetimi - MoSCoW gözden geçirmesi: geride kalan maddeleri yeniden planlamak - develop → main birleştirmesi ve v0.5 etiketi	MVP demo · v0.5
Abdulkahhar Türkoğlu Müşteri Temsilcisi	- MVP kullanıcı kabul testi (UAT) ve geri bildirim listesi - Ara demoyu müşteri sunumu formatında anlatmak - Ümit'e destek: görev detay paneli gibi statik arayüz bileşenleri	UAT raporu · demo sunumu
Mert Yanık Raporlama Sorumlusu	- Sprint 3 raporu - MVP ara raporu: ilerleme %, tamamlanan hikâyeler, burndown - Ara demo toplantı notları	Rapor #5 · MVP ara raporu
Ümit Efe Özkaleli Frontend	- Görev listesi; görev oluşturma/düzenleme; kişi atama seçici - Kanban panosu: sürükle-bırak ile durum değişimi (To Do / In Progress / Done) - Görev detay paneli ve yorum alanı	Kanban + görev ekranları
Mustafa Şahin Backend	- Görev CRUD, atama ve durum güncelleme endpoint'leri - Yorum endpoint'leri - Duruma / kişiye / tarihe göre filtreleme	Görev + yorum API'si
Buğra Durmuş Veri Tabanı Yöneticisi	- Görev, yorum ve görev durum geçmişi tabloları - Durum her değiştiğinde geçmiş kaydı oluşmasını sağlamak - Demo için gerçekçi seed verisi	Şema v2 · demo verisi
Utku Uzun Test Uzmanı	- Görev ve yorum API testleri - Uçtan uca (E2E) test altyapısı ve ilk Kanban senaryosu - Regresyon test listesi	E2E altyapısı · regresyon listesi

M3 · MVP & ara demo (8 Kasım)

Rol bazlı giriş, proje ve görev yönetimi, kişiye atama ve Kanban panosu uçtan uca çalışıyor; main dalında v0.5 etiketi var.

HAFTA

6

SPRINT 5 · GELİŞTİRME

9 – 15 Kasım 2026

Takvim, Gantt & Dosya Paylaşımı



Sprint hedefi

Görevleri zaman ekseninde göstermek (takvim, Gantt) ve proje dokümanlarının yüklenip paylaşılmasını sağlamak (Modül 3-4).

Ekip üyesi	Bu haftanın görevleri	Çıktı
Hakan Koço Proje Yöneticisi	- MVP geri bildirimlerini backlog'a işlemek ve önceliklendirmek - Risk kaydını güncellemek - Frontend yükünü dengelemek: destek görevlerinin dağıtımı	Güncel backlog ve risk kaydı
Abdulkahhar Türkoğlu Müşteri Temsilcisi	- Takvim ve Gantt için kabul kriterleri ve testleri - Kullanım kılavuzu için ekran akışlarını çıkarmak - Ümit'e destek: dosya listesi ekranı	Kabul testi notları · kılavuz akışları
Mert Yanık Raporlama Sorumlusu	- Sprint 4 raporu - Kullanım kılavuzu iskeleti - Raporlama modülünün rapor şablonlarını netleştirmek (günlük/haftalık/aylık içerik)	Rapor #6 · kılavuz iskeleti
Ümit Efe Özkaleli Frontend	- Takvim görünümü (görev başlangıç-bitiş tarihleriyle) - Gantt şeması (öncelik: Should) - Dosya yükleme/indirme arayüzü	Takvim · Gantt · dosya ekranı
Mustafa Şahin Backend	- Dosya yükleme/indirme: tür ve boyut doğrulaması, güvenli saklama - Takvim ve Gantt için tarih aralığı sorguları - MVP'den gelen backend hatalarını düzeltmek	Dosya API'si · tarih sorguları
Buğra Durmuş Veri Tabanı Yöneticisi	- Dosya metadata tablosu ve depolama stratejisi - Test/yayın (staging) ortamının ilk kurulumu - Mustafa'ya dosya servisi entegrasyonunda destek	Staging ortamı
Utku Uzun Test Uzmanı	- Dosya yükleme güvenlik testleri: izinsiz tür, büyük dosya, yetkisiz erişim - Takvimde tarih kenar durumları (ay geçişi, bitiş başlangıçtan önce olan görev) - Test kapsamı (coverage) raporu	Güvenlik testleri · coverage raporu

Haftanın teslimatı

Görevler takvimde ve Gantt şemasında görüntülenebiliyor; projeye dosya yüklenip ekip tarafından indirilebiliyor; staging ortamı ayakta.

HAFTA

7

SPRINT 6 · GELİŞTİRME

16 – 22 Kasım 2026

Raporlama & Analiz



Sprint hedefi

Raporlama modülünü tamamlamak ve hafta sonunda özellik dondurmaya (feature freeze) geçmek.

Ekip üyesi	Bu haftanın görevleri	Çıktı
Hakan Koço Proje Yöneticisi	■ Özellik dondurma kararını vermek ve ilan etmek ■ Kalan Should/Could maddeleri için kesme kararları ■ Test ve stabilizasyon haftasını planlamak	Feature freeze ilanı · H8 planı
Abdulkahhar Türkoğlu Müşteri Temsilcisi	■ Rapor ekranlarının kabul testi (müşteri gözüyle anlamlılık) ■ Final müşteri sunumu kurgusunun taslağı: problem → çözüm → demo ■ Demo senaryosunu güncellemek	Sunum kurgusu taslağı
Mert Yanık Raporlama Sorumlusu	■ Sprint 5 raporu ■ Raporlama modülünün çıktılarını kendi haftalık raporlarıyla karşılaştırıp doğrulamak ■ Final dokümantasyon taslağı	Rapor #7 · final doküman taslağı
Ümit Efe Özkaleli Frontend	■ Dashboard: proje ilerleme yüzdesi ve grafikler ■ Kişi bazlı görev tamamlama raporu ekranı ■ Günlük/haftalık/aylık rapor görünümü (opsiyonel: CSV/PDF dışa aktarım)	Raporlama ekranları
Mustafa Şahin Backend	■ Rapor endpoint'leri (Buğra'nın sorgularını servis etmek) ■ Performans iyileştirmeleri: sayfalama, gereksiz sorguların azaltılması ■ Açık backend hatalarını kapatmak	Rapor API'si
Buğra Durmuş Veri Tabanı Yöneticisi	■ Raporlama sorguları: ilerleme %, kişi bazlı tamamlama, dönemsel özet (durum geçmişinden) ■ Sorgu optimizasyonu ■ Yedekleme ve geri yükleme betiği	Rapor sorguları · yedekleme betiği
Utku Uzun Test Uzmanı	■ Rapor doğruluk testleri (bilinen seed verisiyle beklenen sonuç) ■ Tam regresyon E2E setinin hazırlanması ■ Açık hata listesinin Hakan ile önceliklendirilmesi	Regresyon seti · öncelikli hata listesi

M4 · Özellik dondurma (22 Kasım)

Beş modülün "Must" özellikleri tamam; bu tarihten sonra yeni özellik eklenmez, yalnızca hata düzeltilir.

HAFTA

8

SPRINT 7 · TEST

23 – 29 Kasım 2026

Test, Stabilizasyon & Yayına Alma



Sprint hedefi

Yeni özellik eklemekten hataları kapatmak, sistemi yayın ortamına almak ve sürüm adayını (RC) çıkarmak.

Ekip üyesi	Bu haftanın görevleri	Çıktı
Hakan Koço Proje Yöneticisi	- Kısa günlük hata triyaj toplantıları (15 dk) - Sürüm adayı (RC) kararı - Teslim kontrol listesinin takibi	RC kararı
Abdulkahhar Türkoğlu Müşteri Temsilcisi	- Uçtan uca kullanıcı kabul testi (UAT) ve onay - Demo senaryosu v1: adım adım akış ve örnek veri hikâyesi - Olası müşteri sorularının listesi	UAT onayı · demo senaryosu v1
Mert Yanık Raporlama Sorumlusu	- Sprint 6 raporu - Final dokümantasyonu birleştirmek: mimari, kurulum, API, kullanım kılavuzu - Sunum slaytlarının taslağı	Rapor #8 · doküman v0.9 · slayt taslağı
Ümit Efe Özkaleli Frontend	- Arayüz hatalarının düzeltilmesi - Responsive ve erişilebilirlik iyileştirmeleri - Boş / yükleniyor / hata durumlarının ekranları	Stabil frontend
Mustafa Şahin Backend	- Backend hata düzeltmeleri - Güvenlik kontrolleri: girdi doğrulama, yetki açıkları - API dokümanının son hali	Stabil backend · API dokümanı v1
Buğra Durmuş Veri Tabanı Yöneticisi	- Yayın ortamına dağıtım (deploy) - Demo seed verisinin son hali - Yedekten geri yükleme provası	Canlı ortam
Utku Uzun Test Uzmanı	- Tam regresyon (manuel + otomatik) - Smoke ve temel performans testleri - Test Raporu v1: koşulan/başarılı/başarısız testler, hata istatistikleri	Test Raporu v1

M5 · Sürüm adayı / RC (29 Kasım)

Kritik ve yüksek önemde açık hata yok; sistem yayın ortamında çalışıyor; Test Raporu v1 hazır.

HAFTA

9

SPRINT 8 · TESLİM

30 Kasım – 6 Aralık 2026

Teslim Hazırlığı & Sunum Provası



Sprint hedefi

Ürünü dondurmak, teslim paketini tamamlamak ve müşteri sunumunu iki tam provayla hazır hale getirmek.

Not

Kod dondurma: 3 Aralık Perşembe. Bu tarihten sonra yalnızca demo engelleyen kritik hatalar düzeltilir.

Ekip üyesi	Bu haftanın görevleri	Çıktı
Hakan Koço Proje Yöneticisi	- Kod dondurma (3 Aralık); develop → main birleştirmesi, v1.0 etiketi - İki tam sunum provası yönetmek (süre tutularak) - Proje kapanış raporu: öğrenilen dersler	v1.0 · kapanış raporu
Abdulkahhar Türkoğlu Müşteri Temsilcisi	- Müşteri sunumunun ana anlatıcısı olarak provalar - Canlı demo akışını prova etmek - Soru-cevap hazırlığı	Hazır sunum akışı
Mert Yanık Raporlama Sorumlusu	- Final rapor ve dokümantasyon teslim paketi - Sunum slaytlarının son hali - Tüm haftalık raporların ek olarak derlenmesi	Teslim paketi · slaytlar
Ümit Efe Özkaleli Frontend	- Yalnızca kritik arayüz düzeltmeleri - Sunumda ekran akışını yönetmek - Dokümantasyon için ekran görüntülerini sağlamak	Ekran görüntüleri
Mustafa Şahin Backend	- Yalnızca kritik hata düzeltmeleri - Sunumda teknik mimarinin anlatımı	Mimari anlatımı
Buğra Durmuş Veri Tabanı Yöneticisi	- Yedek demo ortamı (yerel kurulum) ve demo videosu kaydı - Kurulum talimatı (README)	Demo videosu · README
Utku Uzun Test Uzmanı	- Final Test Raporu - Sunumda kalite ve test sürecinin anlatımı - Sunum sabahı son smoke test	Final Test Raporu

M6 · 7 Aralık Pazartesi — Teslim & müşteri sunumu

Çalışan yazılımın canlı demosu, proje dokümantasyonu, test raporu ve süreç kanıtlarından oluşan teslim paketi öğretim üyesine sunulur.

07 İş Yükü Dağılımı

Aşağıdaki ısı haritası, Bölüm 6'daki görevlerin her ekip üyesine haftalık olarak getirdiği tahmini yükü gösterir. Amaç, kimin hangi hafta yoğun olacağını önceden görmek ve vize takvimiyle çakışmaları erkenden yönetmektir.

	H1 5-11 Eki	H2 12-18 Eki	H3 19-25 Eki	H4 26 Eki-1 Kas	H5 2-8 Kas	H6 9-15 Kas	H7 16-22 Kas	H8 23-29 Kas	H9 30 Kas-6 Ara
Hakan Koço · PM	Zirve	Yoğun	Orta	Orta	Yoğun	Orta	Yoğun	Yoğun	Zirve
Abdulkahhar Türkoğlu · Müşteri T.	Zirve	Zirve	Orta	Orta	Yoğun	Orta	Orta	Yoğun	Zirve
Mert Yanık · Raporlama	Orta	Orta	Orta	Orta	Yoğun	Orta	Yoğun	Yoğun	Zirve
Ümit Efe Özkaleli · Frontend	Düşük	Orta	Zirve	Zirve	Zirve	Zirve	Zirve	Yoğun	Düşük
Mustafa Şahin · Backend	Düşük	Yoğun	Zirve	Zirve	Zirve	Yoğun	Yoğun	Yoğun	Düşük
Buğra Durmuş · VT/DevOps	Düşük	Zirve	Yoğun	Orta	Orta	Orta	Zirve	Yoğun	Orta
Utku Uzun · Test	Düşük	Orta	Yoğun	Yoğun	Yoğun	Yoğun	Yoğun	Zirve	Orta

Şekil 7 · Kişi x hafta tahmini iş yükü

Öne çıkan desenler

Desen	Açıklama ve alınan önlem
Geliştirme zirvesi (H3-H7)	Ümit ve Mustafa beş hafta boyunca en yoğun seviyede çalışır. Önlem: Abdulkahhar ve Buğra'nın destek görevleri, hazır bileşen kütüphaneleri ve MoSCoW ile kapsam kesme.
Yönetim zirvesi (H1, H9)	Hakan ve Abdulkahhar başlangıçta (kararlar, gereksinimler) ve sonda (sunum, teslim) zirve yapar; orta haftalarda koordinasyon ve kabul testlerine odaklanılır.
Doküman zirvesi (H9)	Mert'in yükü teslim paketine doğru artar. Önlem: dokümanlar H2'den itibaren iskelet olarak büyütülür, son hafta yalnızca birleştirme yapılır.
Test zirvesi (H8)	Utku'nun en yoğun haftası stabilizasyondur. Önlem: otomasyon H3'ten itibaren kurulur, H8'de testler sıfırdan değil, mevcut setin genişletilmesiyle koşudur.
Veri tabanı zirveleri (H2, H7)	Buğra modelleme (H2) ve rapor sorgularında (H7) yoğunlaşır; aradaki haftalarda DevOps ve backend desteği üstlenir.

Kapasite kuralı

Her Pazartesi Sprint Planlama'da Hakan, o hafta sınavı olan üyelerin "Zirve" görevlerini erteler veya bölüştürür. Bir kişiye aynı hafta hem sınav hem zirve yük düşmemelidir.

08 Sorumluluk Matrisi (RACI)

RACI matrisi, her teslimat için kimin işi yaptığını (R), kimin nihai onay verdiğini (A), kimin görüşüne başvurulduğunu (C) ve kimin bilgilendirildiğini (I) gösterir. Proje Yöneticisi tüm teslimatlarda onay makamıdır; işi yapan kişi her satırda açıkça bellidir.

Teslimat	Hakan	Abdulk.	Mert	Ümit	Mustafa	Buğra	Utku
Proje tüzüğü & sürüm planı	A/R	C	C	I	I	I	I
Gereksinim dokümanı (SRS)	A	R	C	C	C	C	C
Backlog & kabul kriterleri	A	R	I	C	C	I	C
Wireframe'ler	A	R	I	C	I	I	I
Hi-fi mockup & tasarım sistemi	A	C	I	R	I	I	I
ER diyagramı & veri tabanı şeması	A	I	I	I	C	R	I
API sözleşmesi & dokümanı	A	I	C	C	R	C	C
Frontend uygulaması	A	C	I	R	C	I	C
Backend uygulaması	A	I	I	C	R	C	C
Raporlama modülü	A	C	C	R	R	R	C
CI hattı & otomatik testler	A	I	I	C	C	C	R
Dağıtım (deploy) & demo ortamı	A	I	I	C	C	R	C
Test planı & test raporu	A	C	C	I	I	I	R
Haftalık ilerleme raporları	A	C	R	C	C	C	C
Kullanım kılavuzu & final dokümanı	A	C	R	C	C	C	C
Sunum slaytları	A	C	R	C	C	C	C
Müşteri sunumu & canlı demo	A	R	C	C	C	C	C

R

Sorumlu — işi yapan

A

Onaylayan — nihai karar

C

Danışılan — görüş verir


I

Bilgilendirilen

Raporlama modülünde üç kişinin birden R olması bilinçlidir: Ümit ekranları, Mustafa API'yi, Buğra sorguları üstlenir; Mert ise metrik tanımlarıyla danışman rolündedir.

09 Teknik Mimari (Taslak)

Aşağıdaki mimari, teknoloji seçiminden bağımsız bir taslaktır; Sprint 0'daki kararlarla somutlaşır. Her katmanın bir sahibi vardır ve katmanlar arası sözleşme (API) 3. haftada dondurulur.

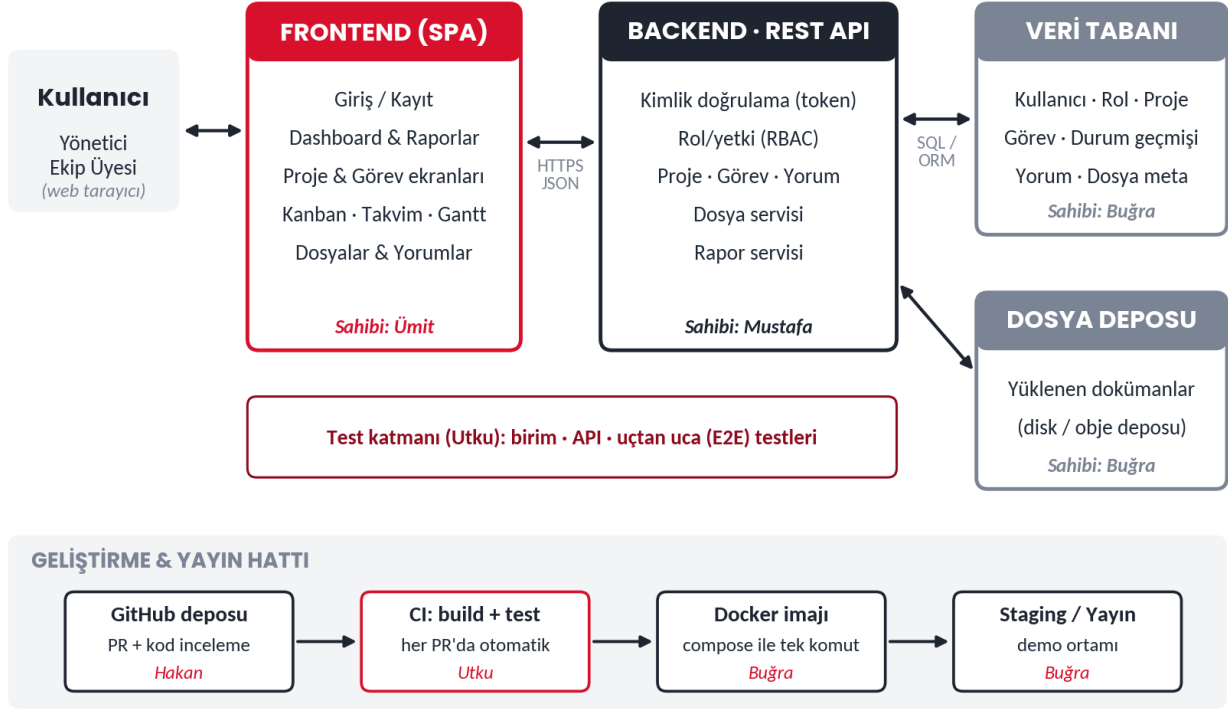

Şekil 8 · Üç katmanlı mimari ve geliştirme/yayın hattı

9.1 Veri modeli taslağı

Varlık	Temel alanlar	İlişkiler
Kullanıcı	ad, e-posta, şifre özeti, sistem rolü	Birçok projeye üye olabilir
Rol	ad (Yönetici, Ekip Üyesi), yetki listesi	Birçok kullanıcıya atanır
Proje	ad, açıklama, başlangıç, bitiş, sahibi	Görevleri, üyeleri ve dosyaları vardır
Proje Üyeliği	proje, kullanıcı, projedeki rolü	Kullanıcı ↔ Proje (çok-çok)
Görev	başlık, açıklama, durum, öncelik, atanmış, başlangıç, bitiş	Bir projeye aittir; yorumları vardır
Görev Durum Geçmişi	görev, eski durum, yeni durum, değiştiren, zaman	Raporlama modülünün ana veri kaynağı
Yorum	görev, yazar, içerik, zaman	Bir göreve aittir
Dosya	proje, yükleyen, ad, tür, boyut, depolama yolu, zaman	Bir projeye aittir

Kritik tasarım kararı: Görev Durum Geçmişi

Yönerge günlük, haftalık ve aylık ilerleme raporları istemektedir. Bu raporlar ancak bir görevin hangi tarihte hangi duruma geçtiği kaydedilirse üretilebilir. Görev Durum Geçmişi tablosu H5'te kurulmazsa geçmiş veriler kaybolur ve raporlar geriye dönük hesaplanamaz.

10 Risk Yönetimi

Risk kaydı H2'de açılır ve her Cuma retrospektifinde güncellenir. Olasılık (O) ve etki (E) Y = Yüksek, O = Orta, D = Düşük olarak derecelendirilmiştir.

#	Risk	O	E	Önem	Sahibi
R1	Frontend ve backend tek kişide; darboğaz oluşması	Y	Y	Hazır bileşen, takvim ve Gantt kütüphaneleri; Abdulkahhar (FE) ve Buğra (BE) destek görevleri; MoSCoW ile kapsam kesme	Hakan
R2	Kapsamın büyümesi ("Azure DevOps'un tamamı")	O	Y	Kapsam H2'de sabitlenir; yeni istek sprint içine değil backlog'a girer; 22 Kasım özellik dondurma	Abdulkahhar
R3	Vize/sınav haftalarının sprintlerle çakışması	Y	O	Sınav takvimi H3'te kapasite planına işlenir; o haftalara hafif hedef; H9 tampon görevi görür	Hakan
R4	FE-BE entegrasyon sorunları	O	Y	API sözleşmesi H3'te dondurulur; OpenAPI dokümanı; FE sahte (mock) veriyle bağımsız ilerler	Mustafa
R5	Testin son haftaya sıkışması	O	Y	H3'ten itibaren her sprintte test görevi; DoD'de otomatik test şartı	Utku
R6	Süreç kanıtlarının eksik kalması (değerlendirme riski)	O	Y	Haftalık rapor, toplantı notu, pano ve PR geçmişi düzenli arşivlenir	Mert
R7	Bir üyenin uzun süre devre dışı kalması	D	O	Dokümante kod, eşli çalışma, her kritik alanda bir yedek kişi	Hakan
R8	Demo günü teknik arıza (internet, sunucu)	D	Y	Yerel kurulum yedeği, kayıtlı demo videosu, hazır seed verisi	Buğra
R9	Merge çakışmaları ve kod kaybı	O	O	Korumalı dallar, küçük PR'lar, develop ile günlük senkronizasyon	Hakan

11 Sprint 0'da Verilecek Kararlar

Bu yol haritası teknoloji seçiminden bağımsız yazılmıştır. Aşağıdaki dört karar ekip tarafından 1. haftanın karar toplantısında (en geç 8 Ekim Perşembe) verilmelidir. Bu bölüm seçim yapmaz; seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını yan yana koyar ve her karar için belirleyici kriteri belirtir.

Karar 1 · Metodoloji

Seçenek	Avantajlar	Dezavantajlar
Scrum (1 haftalık sprint)	+ Hocanın haftalık sprint toplantısı beklentisiyle birebir örtüşür + Roller ve törenler net; burndown ile ilerleme ölçülebilir	- Tören yükü (haftada yaklaşık 2 saat) - Sprint ortasında öncelik değişikliğine kapalı
Kanban	+ Esnek, sürekli akış; toplantı yükü az + WIP limitleri darboğazı (ör. tek frontend) görünür kılar	- Sabit zaman kutusu yok; haftalık hedef takibi zayıflar - "Sprint" beklentisini karşılamak için ek düzen gerekir
Scrumban (hibrit)	+ Haftalık sprint ritmi + Kanban panosu ve WIP limiti + Öğrenci ekiplerinin değişken kapasitesine uyumlu	- Kurallar baştan net yazılmazsa iki yöntemin disiplini de kaybolur

Karar kriteri: Hocanın değerlendirmede hangi yöntemin kanıtlarını aradığı. Bu yol haritasındaki haftalık ritim üç seçenekle de uyumludur.

Karar 2 · Teknoloji yığını

Seçenek	Avantajlar	Dezavantajlar
React + Node.js	+ Uçtan uca tek dil (JavaScript/TypeScript) + Kanban, takvim ve Gantt için geniş hazır kütüphane ekosistemi; hızlı prototip	- Mimari disiplin tamamen ekibe kalır; proje büyüdükçe dağınıklaşabilir
Django + React	+ Kimlik doğrulama, ORM, migration ve yönetim paneli hazır gelir + Backend hızlı ilerler	- İki dil (Python + JavaScript) - Django kurallarını öğrenme süresi
Spring Boot + Angular	+ Kurumsal standart; güçlü tip sistemi ve düzenli mimari	- En dik öğrenme eğrisi ve en fazla kod - 9 haftalık takvimde en yüksek gecikme riski

Karar kriteri: Mustafa ve Ümit'in mevcut deneyimi. Tek kişilik FE ve BE kadrosunda öğrenme süresi doğrudan takvimden yer.

Karar 3 · Veri tabanı

Seçenek	Avantajlar	Dezavantajlar
PostgreSQL	+ Veri doğası gereği ilişkisel (kullanıcı-proje-görev); güçlü raporlama sorguları + Ücretsiz ve yaygın	- Kurulum ve yönetimi MySQL'e göre bir miktar daha karmaşık
MySQL	+ Kurulumu kolay, kaynağı bol, barındırma desteği yaygın	- Bazı gelişmiş veri tipi ve sorgu özelliklerinde PostgreSQL'in gerisinde
MongoDB	+ Esnek şema; JavaScript ile doğal uyum	- Veri ilişkisel; join gerektiren raporlar zorlaşır - Veri bütünlüğü uygulama koduna kalır

Karar kriteri: Raporlama modülünün sorgu ihtiyacı ve Buğra'nın deneyimi.

Karar 4 · Takip aracı

Seçenek	Avantajlar	Dezavantajlar
GitHub Projects	+ Kod, issue ve PR aynı yerde; commit-görev bağlantısı otomatik (süreç kanıtı) + Ücretsiz	- Hazır burndown/sprint raporları sınırlı; elle üretmek gerekebilir
Jira	+ Sektör standardı; sprint, burndown ve hız raporları hazır + Küçük ekipler için ücretsiz plan	- Kurulum ve öğrenme yükü - Kodla entegrasyon için ek ayar gerekir
Trello	+ En basit seçenek; dakikalar içinde başlanır	- Sprint ve burndown gibi Scrum özellikleri yok - Kodla bağlantısı zayıf

Karar kriteri: Hocanın görmek istediği raporlar ve ekibin süreç kanıtı üretme kolaylığı.

Karar tutanağı

Her kararın sonucu, seçilme gerekçesi ve oylama sonucu Mert tarafından karar tutanağına yazılır ve Bölüm 6'daki görev tanımları seçilen teknolojiye göre panoda somutlaştırılır.

12 Teslim Kontrol Listesi

7 Aralık teslimi için gereken tüm parçalar aşağıdadır. Hakan, H8 ve H9 boyunca bu listeyi her gün takip eder; son tarihler sunumdan önce en az bir günlük pay bırakacak şekilde belirlenmiştir.

Teslimat	Sorumlu	Son tarih
☐ Çalışan yazılım (canlı ortam)	Buğra	29 Kasım
☐ Yedek: yerel kurulum + demo videosu	Buğra	4 Aralık
☐ Kaynak kod ve anlamlı commit/PR geçmişi	Hakan	3 Aralık
☐ Gereksinim dokümanı (SRS, güncel sürüm)	Abdulkahhar	29 Kasım
☐ Mimari, ER diyagramı ve API dokümanı	Mustafa, Buğra	29 Kasım
☐ Kurulum talimatı (README)	Buğra	4 Aralık
☐ Kullanım kılavuzu	Mert	4 Aralık
☐ Test planı + Final Test Raporu	Utku	4 Aralık
☐ Tüm haftalık raporlar, toplantı notları, burndown	Mert	6 Aralık
☐ İş bölümü kanıtı (kişi bazlı katkı özeti)	Hakan, Mert	6 Aralık
☐ Sunum slaytları	Mert	4 Aralık
☐ Proje kapanış raporu	Hakan	6 Aralık

Ek A · Haftalık İlerleme Raporu Şablonu

Mert'in her Pazar yayımlayacağı raporun önerilen bölümleri aşağıdadır. Aynı şablonun 9 hafta boyunca kullanılması, final dokümantasyonda süreç kanıtlarının tutarlı görünmesini sağlar.

Bölüm	İçerik
Künye	Rapor no, hafta, tarih aralığı, hazırlayan
Sprint hedefi	Hedef cümlesi ve gerçekleşme durumu: Tamamlandı / Kısmen / Gerçekleşmedi
Tamamlanan işler	Pano kartlarına bağlantılarla kısa liste
Devreden işler	Bir sonraki sprinte geçen işler ve nedenleri
Metrikler	Burndown grafiği, tamamlanan story point, açılan/kapanan hata sayısı
Kişi bazlı katkı	Her üye için tamamlanan görev, açılan PR ve yapılan review sayısı
Riskler ve engeller	Yeni açılan, güncellenen ve kapanan riskler
Retrospektif özeti	İyi gidenler, geliştirilecekler, gelecek haftanın aksiyonları
Gelecek hafta	Bir sonraki sprintin hedefi ve öne çıkan işler
